

Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G02023 **del** 21/02/2017

Proposta n. 2899 **del** 17/02/2017

Oggetto:

Approvazione variante in corso di esecuzione e atto di sottomissione relativo alla fornitura e posa in opera, di container estensibili e monoblocchi prefabbricati coibentati per l'allestimento di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) presso il Comune di Amatrice a seguito dell'evento sismico accaduto nel Centro Italia durante il mese di agosto 2016 - Lotto 1 - CIG n. 685533730E.

OGGETTO: Approvazione variante in corso di esecuzione e atto di sottomissione relativo alla fornitura e posa in opera, di container estensibili e monoblocchi prefabbricati coibentati per l'allestimento di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) presso il Comune di Amatrice a seguito dell'evento sismico accaduto nel Centro Italia durante il mese di agosto 2016 - Lotto 1 - CIG n. 685533730E

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
DI CONCERTO
CON IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
E
CON IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE
SOCIALI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 723, con la quale è stato conferito al dott. Vincenzo Panella l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2016, n. 661, con la quale è stato conferito al dott. Carmelo Tulumello, l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti*", così come modificata e integrata con la determinazione G06487 del 7 giugno 2016;

VISTA la circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell'11 luglio 2016 sulle funzioni e attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 "*Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286*";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 “*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178, recante “*Dichiarazione dello stato di calamità naturale*” ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - attesa l’impellente necessità di sostituire, per finalità di salvaguardia della salute e dell’incolumità pubblica, le attuali strutture temporanee di assistenza socio-sanitaria, realizzate con l’ausilio di tende, di per sé non utilizzabili a lungo termine e a maggior ragione durante la stagione invernale – hanno di concerto definito le caratteristiche tecniche dei modelli idonei all’assolvimento delle stesse finalità di assistenza socio sanitaria nonché i presumibili prezzi delle stesse, da considerare ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13077 del 7 novembre 2016, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della fornitura, compresa posa in opera, di container estensibili e monoblocchi prefabbricati coibentati per l’allestimento di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) presso il Comune di Amatrice mediante gara suddivisa in 2 lotti funzionali (Lotto 1 - CIG n. 685533730E; Lotto 2 - CIG n. 6855352F6B) e sono stati approvati i relativi atti di gara;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15571 del 21 dicembre 2016, con la quale è stata approvata la graduatoria per la procedura aperta per l’affidamento di cui trattasi, aggiudicando il Lotto 1 alla Carpenteria Carena s.r.l., avente sede legale in Via Salsasio, 9, 10122, Carmagnola, (TO);

PRESO ATTO che per l’urgenza della fornitura, già rappresentata in atti, e così come previsto nel disciplinare di gara, l’aggiudicazione è divenuta immediatamente efficace e che, in deroga all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, si è proceduto alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal contratto;

DATO ATTO che il contratto con il soggetto sopra indicato è stato stipulato in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale tra le parti in data 13 gennaio 2017 per un importo complessivo di euro di euro 537.837,90 (cinquecentotrentasettemilaottocentotrentasette/90), di cui 22.000,00 (ventiduemila/00) per costi aziendali sicurezza;

CONSIDERATO:

- che a seguito della stipula del contratto sono state tempestivamente attivate tutte le verifiche tecniche necessarie al completo adeguamento dello schema, predisposto in sede di gara, con

le caratteristiche costruttive dei prodotti forniti dall'aggiudicatario, resolvendo, anche nel corso di sopralluoghi congiunti tra i diversi soggetti coinvolti, tutti gli aspetti costruttivi;

- che gli eventi sopravvenuti nella giornata del 18 gennaio con le nuove scosse sismiche che hanno interessato il centro Italia, nonché l'emergenza neve che ha colpito il territorio hanno reso impossibile prevedere la durata dell'emergenza e della necessità di garantire l'assistenza alla popolazione;
- che a seguito di quanto richiamato al punto precedente le strutture sanitarie del territorio sono state ulteriormente colpite, non potendo pertanto individuare con precisione il tempo di utilizzo del PASS;
- che nel corso dei sopralluoghi e delle riunioni effettuate con le strutture sanitarie competenti della ASL di Rieti, sono state evidenziate alcune necessità per una maggiore dotazione impiantistica del PASS a fronte del prevedibile prolungamento del tempo di utilizzo della struttura;
- che la ditta Carpenteria Carena s.r.l. ha manifestato, con nota del 30 gennaio 2017, la piena disponibilità alla realizzazione di tali ulteriori dotazione dell'allestimento interno;
- inoltre che, le avverse condizioni meteo evidenziate hanno reso non idoneo l'utilizzo delle risorse già presenti sul territorio per la realizzazione delle predisposizioni delle reti di approvvigionamento ed allaccio ai servizi per la struttura del PASS;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 437 del 16 febbraio 2017 *“Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”*,

ATTESO che si rende necessario predisporre perizia di variante, al fine di apportare alcune modifiche determinate da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento del contratto;

CONSIDERATO che la presente perizia di variante in corso d'opera trova specifica collocazione nella lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in quanto essenzialmente derivante da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione, che non alterano la natura generale del contratto;

VISTO l'allegato verbale di variante in corso d'opera redatto dal RUP, Arch. Gabriella Casertano e dal DEC, ing. Alessandra Ajese, in merito alla predetta proposta di perizia di variante in corso d'opera predisposta, relativa alle prestazioni del contratto di fornitura in oggetto, che presenta il seguente quadro economico delle maggiori prestazioni per complessivi € 81.287,41 (IVA inclusa), rientranti nel finanziamento di gara;

CONSIDERATO che a garanzia di una maggiore efficacia dell'attività amministrativa, al fine di evitare lungaggini nelle procedure, stante l'urgenza dell'attività di che trattasi, a vantaggio di una maggiore economicità del procedimento, è stata richiesta alla ditta aggiudicataria la disponibilità all'esecuzione di tali ulteriori opere;

VISTA la nota del 13 febbraio 2017, con cui la ditta Carpenteria Carena s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione delle maggiori opere richieste, inviando gli allegati tecnici ed economici relativi;

CONSIDERATO che la documentazione fornita, allegata al presente atto, risulta conforme sia dal punto di vista tecnico che amministrativo;

PRESO ATTO che l'importo economico delle maggiori opere ammonta a complessivi € 81.287,41 (IVA inclusa), rientranti nel finanziamento di gara e che tali lavorazioni aggiuntive non comportano alcuna maggiorazione dei tempi contrattuali;

CONSIDERATO inoltre che la ditta Carpenteria Carena s.r.l., ha espresso la volontà di subappaltare alla ditta artigiana Elte 1 di Bovero Giacomo, per la realizzazione delle opere esterne di collegamento impiantistico, non comprese nell'appalto originario, per un valore compreso nel 30% delle maggiori opere affidate;

ACCLARATO che l'importo complessivo di perizia quantificato in €. 81.287,41 IVA inclusa e quindi, non eccede il quinto d'obbligo rispetto all'importo contrattuale;

SOTTOLINEATO, pertanto, che è sufficiente sottoscrivere solo atto di sottomissione, stante il fatto che l'aumento dell'importo del contratto è inferiore al quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che la necessità delle maggiori opere richieste è stata determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili in sede di gara, e prevede anche l'esecuzione di categorie non presenti nell'appalto originario;

DATO ATTO che la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 106, (*modifica di contratti durante il periodo di efficacia*), comma 1;

VISTO lo schema di atto di sottomissione;

VISTO l'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne gli obblighi di comunicazione all'ANAC;

RITENUTO opportuno e necessario procedere all'approvazione della variante in corso di esecuzione e atto di sottomissione relativo alla fornitura e posa in opera, di container estensibili e monoblocchi prefabbricati coibentati per l'allestimento di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) presso il Comune di Amatrice a seguito dell'evento sismico accaduto nel Centro Italia durante il mese di agosto 2016 - Lotto 1 - CIG n. 685533730E

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

di approvare l'esecuzione delle maggiori prestazioni di cui alla perizia di variante in corso d'opera relativa al contratto in oggetto e gli allegati tecnici economici (Allegato "A");

1. di approvare l'affidamento delle opere aggiuntive, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Carpenteria Carena s.r.l., per un maggiore importo di € 81.287,49 (IVA inclusa), rientrante nel finanziamento di gara,
2. di approvare lo schema di atto di sottomissione (Allegato "B");
3. di dare mandato al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, dott. Carmelo Tulumello, alla firma dell'atto di sottomissione;

4. di dare atto che si procederà con atto separato alla conferma degli impegni presi ed al disimpegno dell'economia di spesa derivante dalla gara.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE
E POLITICHE SOCIALI
Dott. Vincenzo Panella

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE REGIONALE
CENTRALE ACQUISTI
Dott. Stefano Acanfora

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE
Dott. Carmelo Tulumello

FORNITURA E POSA IN OPERA, DI CONTAINER ESTENSIBILI E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI PER L'ALLESTIMENTO DI UN POSTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA (PASS) PRESSO IL COMUNE DI AMATRICE RESOSI NECESSARIO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO ACCADUTO NEL CENTRO ITALIA DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 - LOTTO 1 - CIG: 685533730E

Impresa appaltatrice: Carpenteria Carena s.r.l., avente sede legale in Via Salsasio, 9, 10122, Carmagnola, (TO), C.F./P.IVA 06410060013

Contratto: Contratto sottoscritto in Roma in data 13 gennaio 2017.

Importo contrattuale (contratto originario): € 537.837,90 esclusa IVA al 22%

Verbale di variante in corso d'opera

Premesso:

- che con contratto stipulato in data 13 gennaio 2017, la ditta Carpenteria Carena s.r.l., ha assunto la fornitura in opera di che trattasi per l'importo di € 537.837,90, di cui € 22.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 13,67%;
- che nel corso dell'esecuzione del contratto si è reso necessario l'affidamento di maggiori opere e lavorazioni complementari all'appalto originario al fine di procedere all'implementazione delle datazioni impiantistiche del Posto di assistenza socio-sanitaria (PASS) ed alla realizzazione delle opere di sistemazione e urbanizzazione esterna per l'allestimento della struttura;
- che con sopralluoghi del 5 e 24 gennaio presso le aree sono stati affrontati tutti gli aspetti costruttivi e dettaglio relativi alle esigenze espresse dai referenti della ASL di Rieti;
- che visto il perdurare della situazione di emergenza e l'aggravarsi di alcune condizioni territoriali, anche a seguito degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio, si rende necessario garantire un maggior livello di dotazione impiantistica per il prolungarsi dei tempi di utilizzo del PASS ed una maggiore specializzazione delle attività che vi svolgeranno, in particolare con la predisposizione per il collegamento rete dati e la sostituzione dei previsti lavandini campali, con impianti fissi;
- che in ragione delle situazioni richiamate per favorire il ripristino delle condizioni di normalità del territorio è opportuno non utilizzare le risorse presenti sul territorio per la realizzazione delle opere esterne di urbanizzazione;
- acquisita la disponibilità della ditta alla verifica tecnica ed esecuzione delle modifiche richieste;

si è proceduto alla verifica, in contraddittorio con la ditta e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, delle soluzioni prospettate ritenendo conformi e congrue quelle oggetto del progetto di variante presentato.


Con il presente verbale si approvano

- planimetra con opere di urbanizzazione esterna
- pianta del PASS
- computo metrico estimativo


17 febbraio 2017

Per la REGIONE LAZIO


Il DEC – ing. Alessandra Ajese



Il RUP – Arch. Gabriella Casertano



OGNI MODULO ESTENSIBILE PREVEDE UNA ALIMENTAZIONE
 INDIPENDENTE CON SPINA TIPO GEWISS GW 60404 E
 PREDISPOSIZIONE PER n. 2 PRESE DATI TIPO RJ45

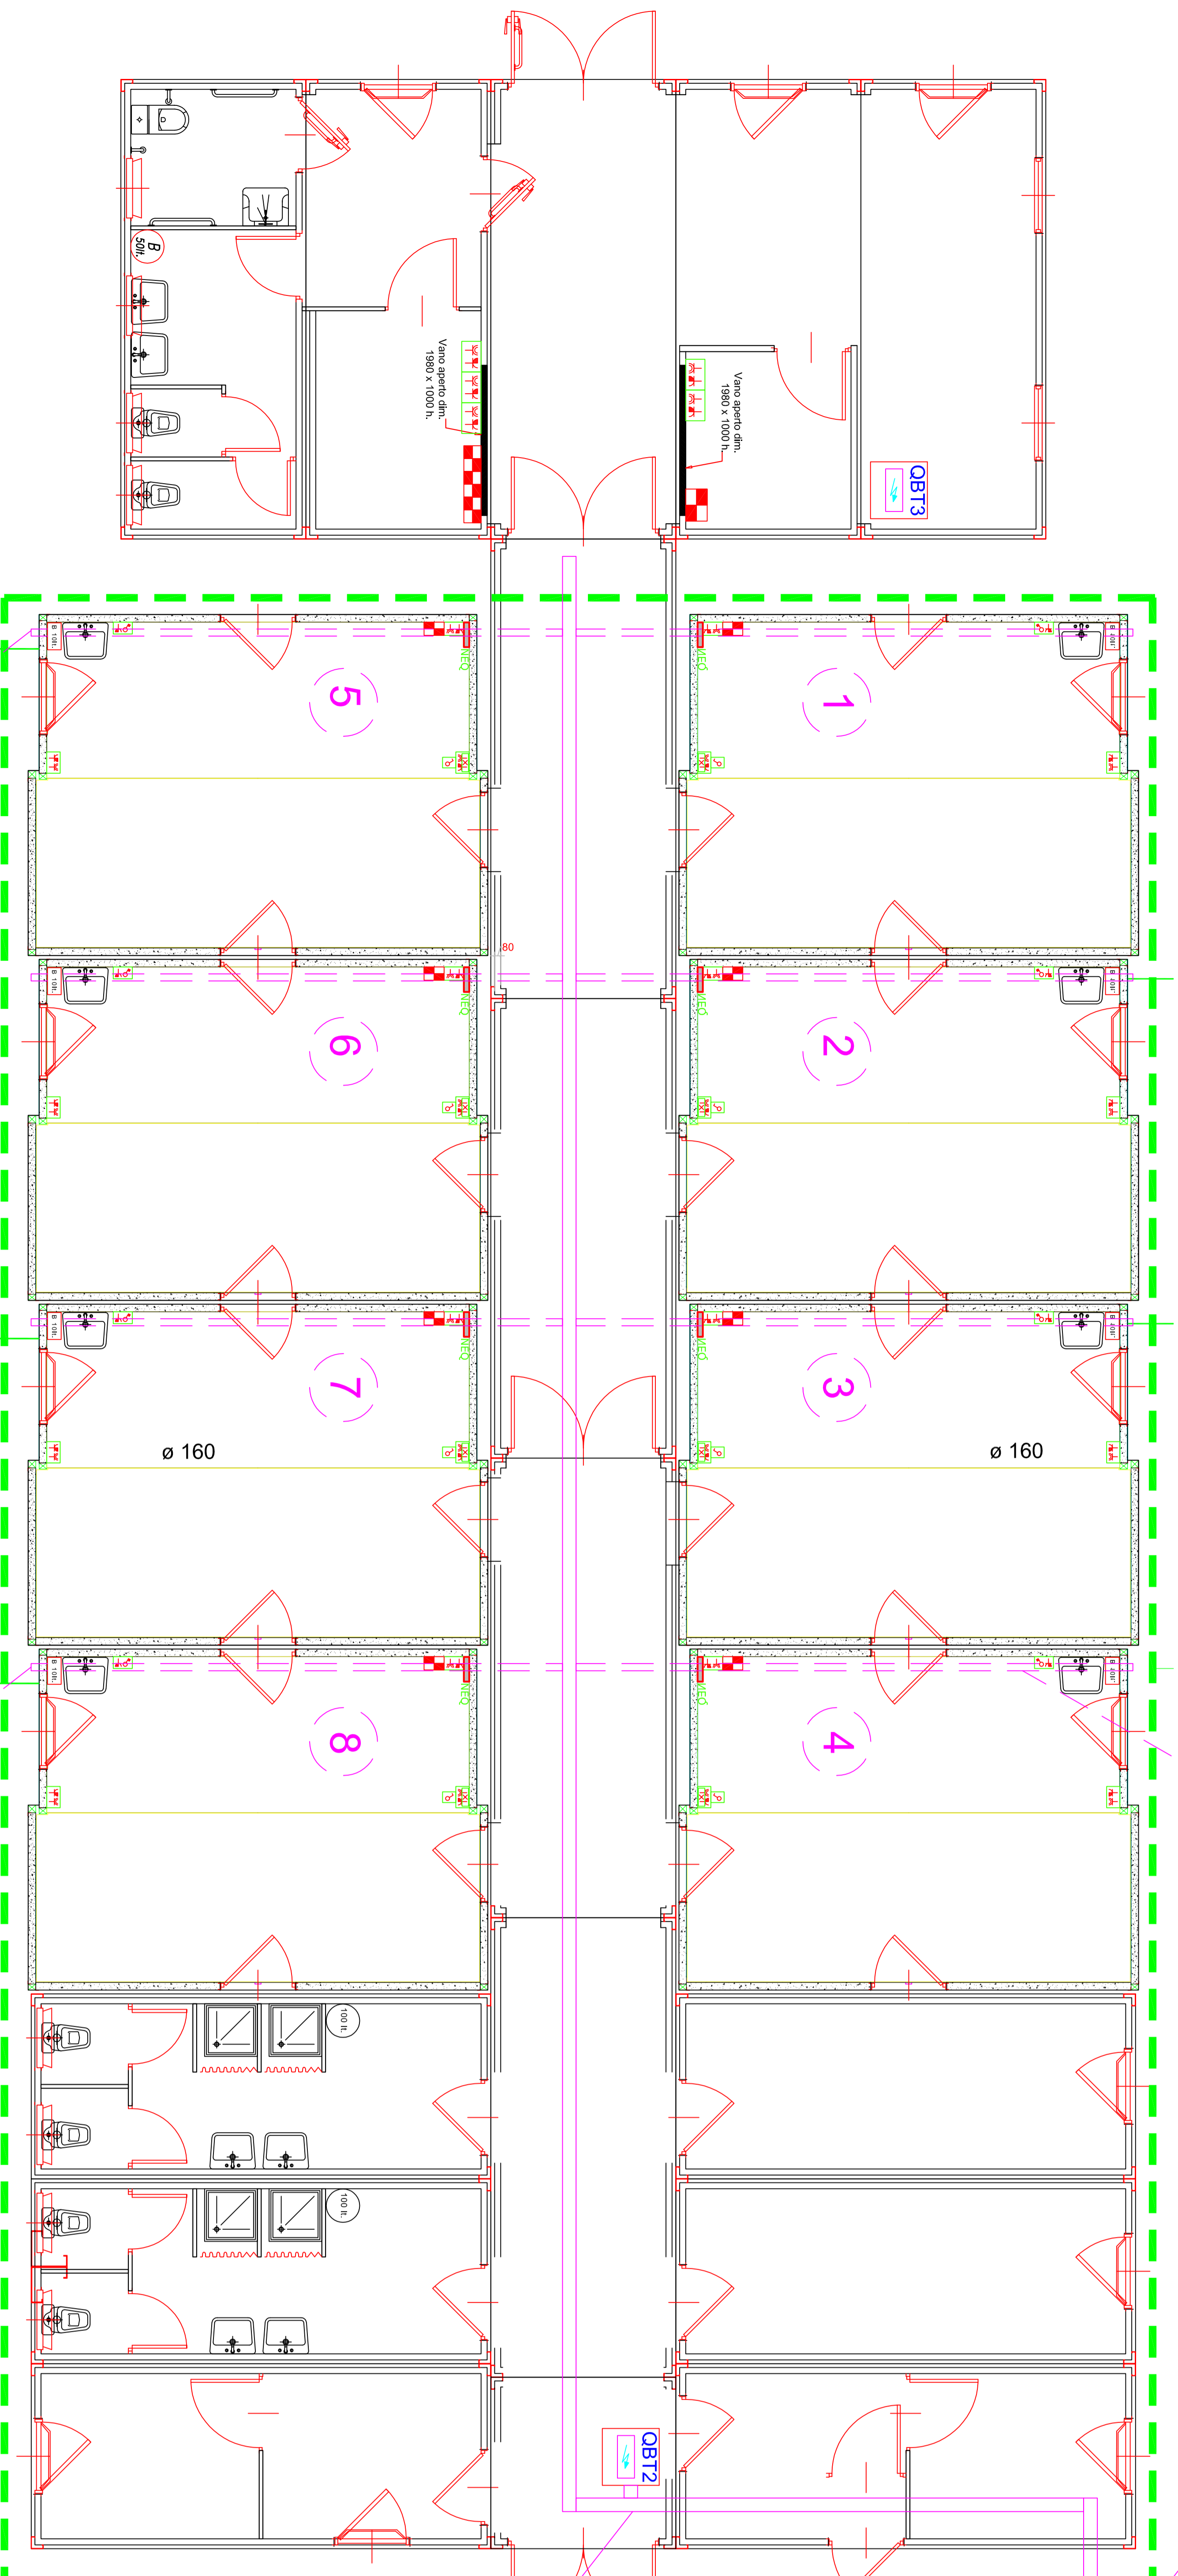

DISPERSORE
 ALLACCIAMENTO ENEL

PREDISPOSIZIONE CONNESSIONE
 DATI CON RJ45



CONNESSIONE CON SPINA GEWISS GW60404



TUBAZIONE IN CORRUGATO FLESSIBILE SERIE PESANTE Ø25

QUADRO ELETTRICO A PARETE IP55 54 MODULI

QUADRO ELETTRICO A PARETE IP55 18 MODULI


QUADRO ENEL

CIRCA 90 METRI

CAVIDOTTO IN PVC SERIE N 450N Ø 125
 CAVO FG7OR 0.6/1kV (3x50 + 1x25) mmq


POZZETTO ISPEZIONE

POZZETTO ISPEZIONE

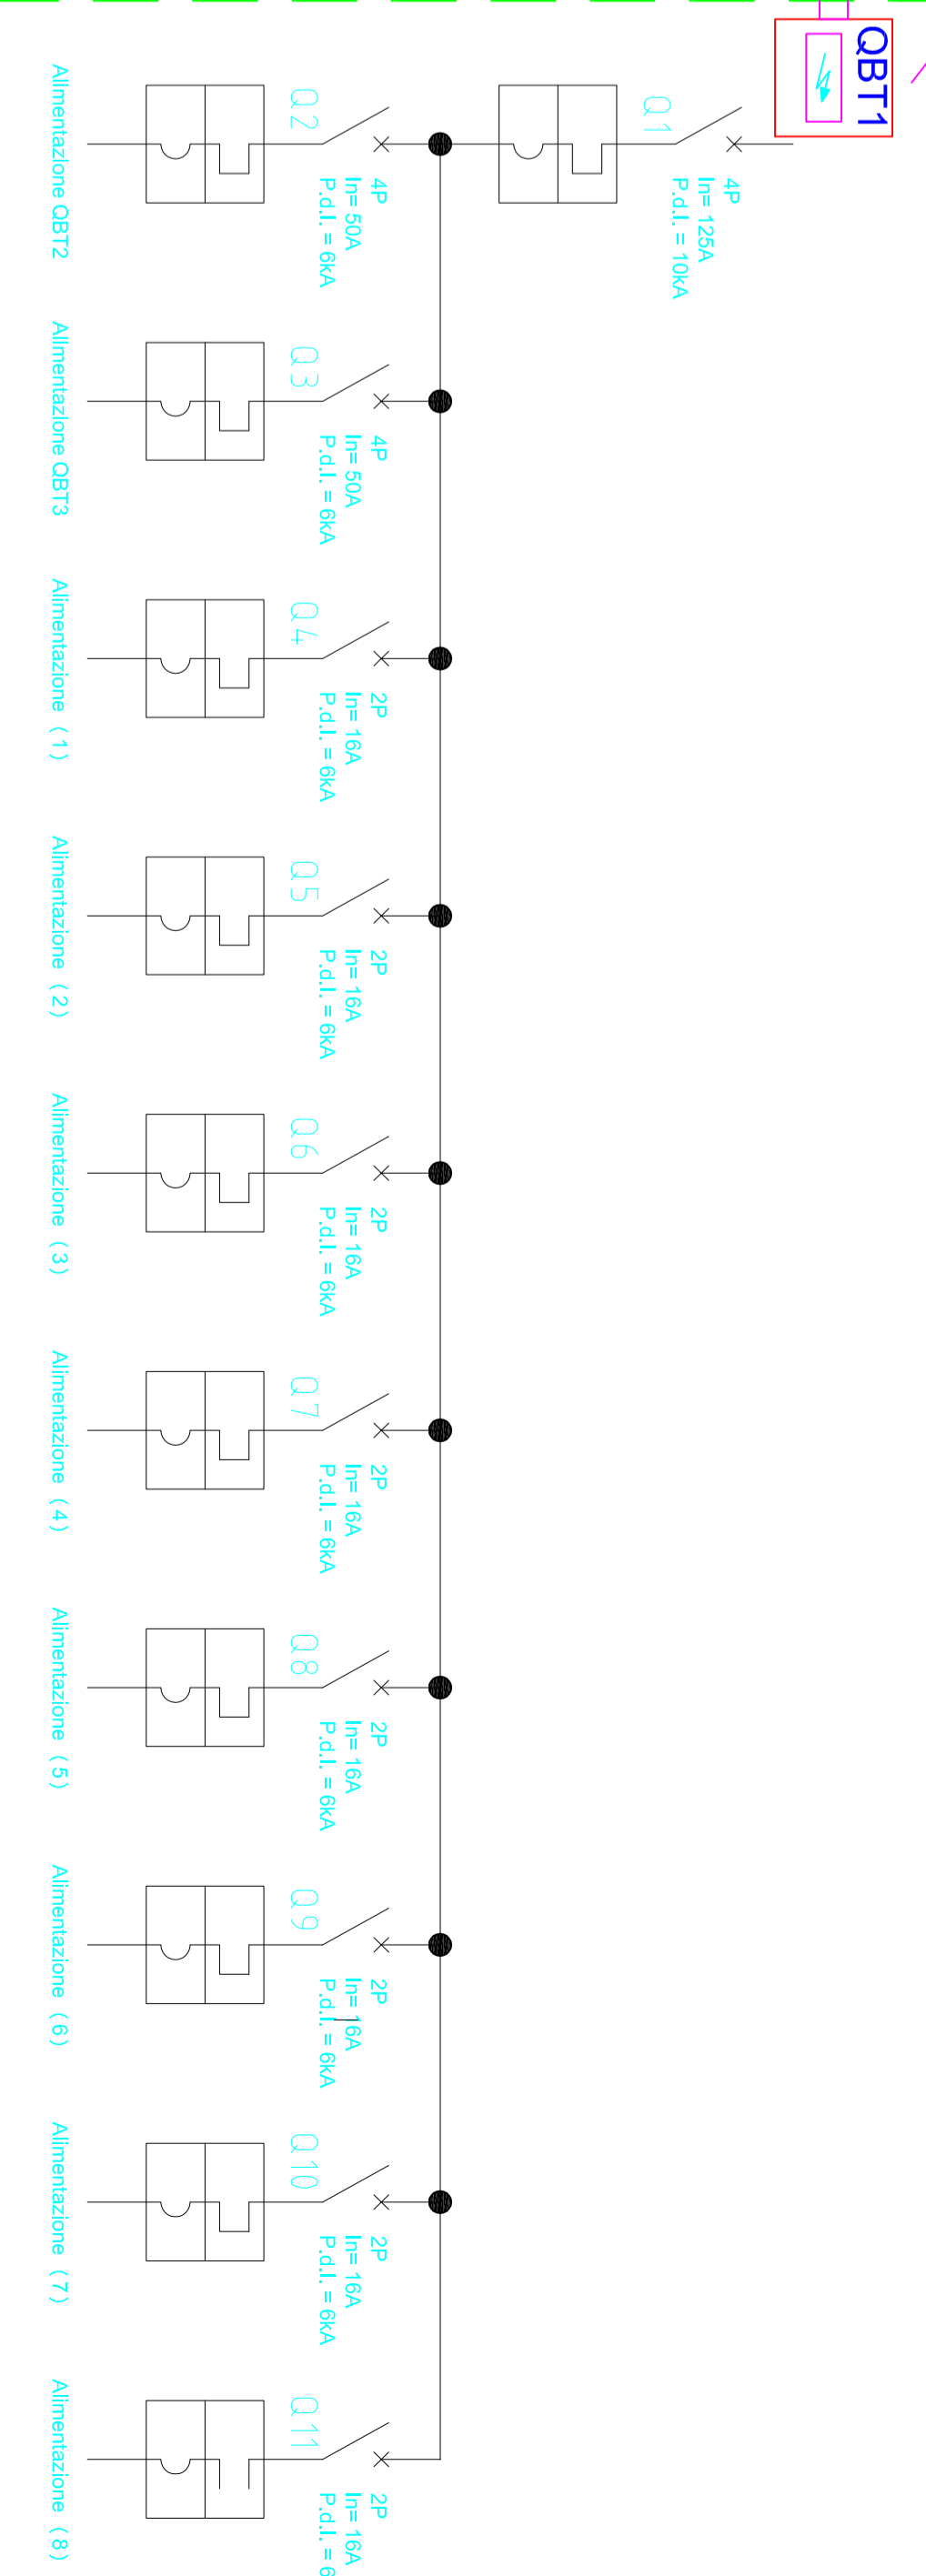

CORDA IN RAME NUDO S = 25mmmq

CANALE CABLOFIL CON COPERCHIO SUL TETTO 150x54

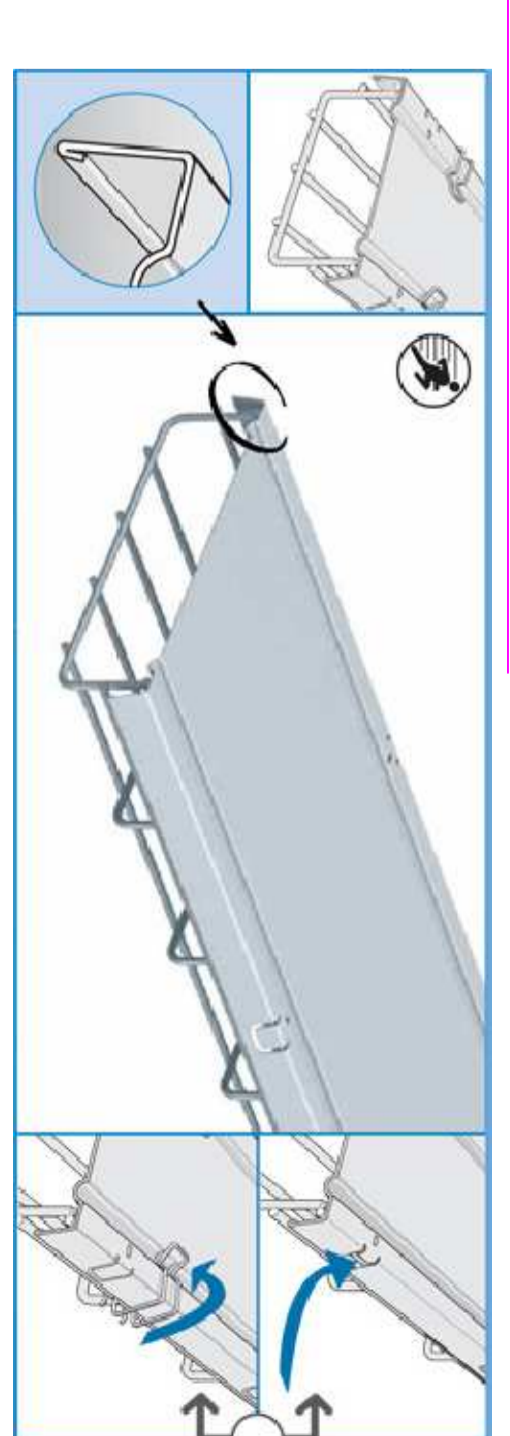

Copia



Comune di Amatrice
Provincia di Rieti

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PASS

COMMITTENTE: REGIONE LAZIO

Data, 17/02/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A02.01.003.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto per posa corrugato energia per posa fognature per posa tubo acqua		90,00 95,00 95,00	0,500 0,500 0,500	0,500 0,500 0,500	22,50 23,75 23,75		
	SOMMANO m ³					70,00	15,13	1'059,10
2 NP 1	Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con filo d'ferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 100 da armadio ENEL a PASS		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	6,80	612,00
3 A02.02.001.b	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego per posa corrugato per posa fognatura per posa tubo acqua		90,00 95,00 95,00	0,500 0,500 0,400	0,500 0,500 0,700	22,50 23,75 26,60		
	SOMMANO m ³					72,85	7,62	555,12
4 A14.01.001.c	Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a 500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m ³ di sabbia, dello spessore di 2 cm, battuto, suddiviso in riquadri, liscio ... di sottofondo di conglomerato cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 dello spessore di: dello spessore di 12 cm ingresso PASS pubblico ingresso PASS di servizio		5,00 5,00	4,000 4,000		20,00 20,00		
	SOMMANO m ²					40,00	37,60	1'504,00
5 A16.02.001.a	Infissi in PVC/alluminio rigido antiurtizzato ad elevata resilienza, rispondente alle norme UNI e alle direttive UEATC - ICITE, con spessore minimo dei profilati 70 mm, inclusi vet ... nel suo complesso (telai e vetrazione): 2= Uw = 2,4 Wm ² K: (minimo da contabilizzare 1,50 m ² : serramento ad un battente in aggiunta al capitolato :vasistas; da capitolato n° 8 finestre 1100 + 4 finestre da 1100 + 4 vasistas totale 16 serramenti; nel layout ultimo sono 19 fra porte, finestre e vasistas relativi a questa voce di capitolato in aggiunta al capitolato :porte interne					3,00 9,00		
	SOMMANO cd					12,00	400,00	4'800,00
6 A17.02.001.b	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli rampa ingresso e scalini				780,000	780,00		
	SOMMANO kg					780,00	6,20	4'836,00
	A RIPIORTARE							13'366,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'366,22
7 D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie su container					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	78,09	624,72
8 NP 2	Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico IP+N C 10A- 230V p.i. 3000 A (da incasso su scatola tipo 503), conforme norme CEI, completa di accessori, in opera: Presa interbloccata con interruttore 2P+T 16 A tipo Schuko vari					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	177,00	1'770,00
9 D04.03.005.c	Spine e prese mobili: Corpo in policarbonato, protezione contro i contatti accidentali; conformi alle Norme CEI 23-16,CEI 23-50, (IEC 884-1) - 2P+T - 250V, in opera: Presa mobile 10/16A uscita cavo assiale su estensibili					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	16,44	131,52
10 NP 3	Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 3 ... re ampliabile, al m² di superficie frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsettieria, al polo: da 32 a 100A quadro generale quadro generale con automatico da 100 A - IP 55 dopo quadro enel					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'880,00	3'760,00
11 NP 4	Targa in alluminio con indicazione presa di terra varie					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	15,00	120,00
12 NP 5	Compensato tipo marino spessore mm 18 invece che mm 15 da capitolato				305,000	305,00		
	SOMMANO					305,00	0,00	0,00
13 NP 6	lavandini servizi in ceramica					10,00		
	SOMMANO					10,00	0,00	0,00
14 NP 7	lavabo WC disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	75,00	75,00
15 NP 8	maniglioni su porte tipo " clinica medica"					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	145,00	435,00
	A R I P O R T A R E							20'282,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'282,46
16 NP 9	Pareti interne aggiuntive in lamiera sandwich mm 50 doppio rivestimento in opera - COMPENSATO sporco/pulito - PUA - bagni di servizio					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	0,00	0,00
17 NP 10	finestre esterne in PVC/alluminio tutte anta/ribalta					30,00		
	SOMMANO					30,00	0,00	0,00
18 NP 11	fornitura e posa di termoventilatori nei bagni da 1000/2000 W con presa di corrente , in opera				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	380,00	760,00
19 NP 12	minicontainer testa corridoio lato servizi, realizzato come i container fissi, senza accessori, compreso pavimento, calcolato il prezzo a mq come segue: n. 21 container da 20" per ... stiche degli altri fissi, si ribassa del 40 % il prezzo medio , quindi € 1619 - 40% = € 971 che si arrotonda a € 980/ mq		2,50	2,500		6,25		
	SOMMANO m2					6,25	980,00	6'125,00
20 NP 13	sostituzione n. 2 containers 40" con n. 4 da 20"				1,000	1,00		
	SOMMANO					1,00	0,00	0,00
21 NP 14	pieдини per regolazione in altezza dei container, vista l'irregolarita' di posa, compreso di piastre di appoggio					92,00		
	SOMMANO cadauno					92,00	48,00	4'416,00
22 NP 15	vetri serramenti ambulatori medici satinati					200,00		
	SOMMANO					200,00	0,00	0,00
23 NP 16	dispositivo libero/occupato su porte WC					3,00		
	SOMMANO					3,00	0,00	0,00
24 NP 17	Vaso gabinetto in aggiunta rispetto a capitolato				1,000	1,00		
	SOMMANO					1,00	0,00	0,00
25 NP 18	Predisposizione linee dati/telefono prese RJ45 e tubi di collegamento all'esterno dei moduli, esclusi cavi e loro posa Prese RJ45				21,000	21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	171,00	3'591,00
26 NP 19	Fornitura e posa di linee per collegamenti dei 2 quadri uffici Collegamenti tra quadri di sicurezza				1,000	1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		35'174,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		35'174,46
	SOMMANO a corpo					1,00	1'560,00	1'560,00
27 NP20	Anello equipotenziale in corda di rame mmq 50 in opera, compresi spezzoni per collegamenti containers , e puntazze di dispersione per scarico terra				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'150,00	1'150,00
28 NP 21	Collegamento tra quadri enel e quadri generali containers, con cavo FG7 per potenze fino a 100KW, in opera				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'800,00	4'800,00
29 NP 22	Collegamento impianto idrico di acqua potabile, in opera, compreso di tubi, flange, manicotti, fino ai containers, in HPDE PN 10				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'800,00	3'800,00
30 NP 23	Collegamento alla fognatura esistente, in opera, compreso di fornitura di tubi vari diametri, selle, braghe, amplificatori e riduzioni, ispezioni, pozzetti con chiusini, collegamenti ai containers in PVC pesante				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	14'750,00	14'750,00
31 NP 24	Boiler elettrico 10lt compreso scarico acqua				8,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	190,00	1'520,00
32 NP 25	Cassone preisolato con giunti a copertura degli allacciamenti e degli scarichi dei containers serviti da acqua e fognatura per eliminare il rischio gelo Bagni pubblici 1X 6 METRI (2600,00 €) Bagni di servizio personale 1X 5 METRI (2300,00€) Containers estensibili 8 PER 1 METRO (480X8=3840,00€)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'740,00	8'740,00
33 NP 26	Sostituzione di n° 1 finestra su un Container estensibile con n° 1 porta esterna compresi i gradini per scendere da piano pavimento container a piano 0 del Pass (dislivello circa 250mm) A COMPENSAZIONE CON FINESTRA PREVISTA SU CAPITOLATO				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
34 NP27	N° 27 plafoniere emergenza Led 18W autonomia 2h, in opera, compresi i collegamenti Plafoniere di emergenza				27,000	27,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	185,00	4'995,00
35 NP 28	Lavorazioni aggiuntive Progettazione preliminare opere di urbanizzazione Collaudi interni, verifiche, certificazioni				45,000 37,000	45,00 37,00		
	A RIPO RTARE					82,00		77'689,46

