CRONOPROGRAMMA: **LAVORI A SEGUITO DI RIESAME A.I.A. – Discarica Cerreto**

Data inizio lavori prevista: data emissione provvedimento finale A.I.A.

| N° | Descrizione preventiva fasi di lavoro |
|---|---|
| | **COMPARTO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE** |
| **1** | **REALIZZAZIONE NUOVI PIEZOMETRI** |
| 1a | Realizzazione dei nuovi piezometri, denominati Pz10, Pz11, Pz12, Pz13, Pz14 e Pz15, secondo le indicazioni fornite da IRSA |
| | **COMPARTO DEPURAZIONE REFLUI** |
| **2** | **LINEE CONVOGLIAMENTO REFLUI**<br>Completamento delle linee di convogliamento dei reflui presso l'impianto di depurazione |
| 2a | Realizzazione tubazioni per il collettamento dei reflui prodotti presso le sottostazioni del biogas, area di |
| 2b | Allestimento delle vasche di rilancio dei reflui verso l'impianto di depurazione |
| | **COMPARTO GESTIONE RIFIUTI** |
| **3** | **POSIZIONAMENTO DI N. 2 SERBATOI** da 2 e 5 mc, dotati del proprio bacino di contenimento, per il deposito temporaneo dei rifiuti reflui cicili CER 200304 prodotti presso i servizi igienici dei locali adibiti ad uso uffici, laboratorio, mensa e spogliatoio, in sostituzione delle esistenti vasche a tenuta |
| **4** | **ALLESTIMENTO AREE RIFIUTI** come da planimetria<br>Approvvigionamento dei contenitori per i rifiuti prodotti e dislocazione come previsto in planimetria B.22 |
| | **COMPARTO EMISSIONI** |
| **5** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO GE2 Rev** |
| 5a | Realizzazione nuova linea di evacuazione fumi con Post-combustore 3 |
| 5b | Realizzazione nuova linea biogas e aria compressa per Post-combustore 3 |
| 5c | Avviamento Post-combustore 3 |
| **6** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO POST-COMBUSTORI 1 e 2** |
| 6a | Realizzazione nuova linea evacuazione fumi con Denox su Post-combustore 1 |
| 6b | Realizzazione nuova linea evacuazione fumi con Denox su Post-combustore 2 |
| **7** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI DEI POST-COMBUSTORI 1 e 2** |
| 7a | Smontaggio e invio presso il fornitore degli strumenti ABB Uras 26 e Magnos 206, installati a servizio del Post-combustore 1 |
| 7b | Riconfigurazione del campo scala di misura per il parametro $SO_2$ |
| 7c | Installazione e taratura degli strumenti ABB Uras 26 e Magnos 206, a servizio del Post-combustore 1 |
| 7d | Smontaggio e invio presso il fornitore degli strumenti ABB Uras 26 e Magnos 206, installati a servizio del Post-combustore 2 |
| 7e | Riconfigurazione del campo scala di misura per il parametro $SO_2$ |
| 7f | Installazione e taratura degli strumenti ABB Uras 26 e Magnos 206, a servizio del Post-combustore 2 |
| 7g | Implemantazione software SME |
| **8** | **Determinazione dell'Indice di Accuratezza Relativo e verifica della linearità della risposta strumentale su tutto il campo di misura**<br>A seguito della necessità di modificare alcuni componenti dello SME (strumento ABB Uras 26 e Magnos 206), le verifiche dello stesso (determinazione dello IAR e verifica della linearità della risposta strumentale su tutto il campo di misura), previste per il mese di luglio 2016, saranno posticipate secondo il programma di seguito specificato |
| 8a | Determinazione dello IAR e verifica della linearità della risposta strumentale sul punto di emissione E7 |
| 8b | Determinazione dello IAR e verifica della linearità della risposta strumentale sul punto di emissione E8 |
| **9** | **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO GE5** |
| 9a | Installazione del Gruppo Elettrogeno GE5 |
| 9b | Realizzazione Stazione Biogas relativa al Bacino 4 |
| 9c | Realizzazione nuova linea evacuazione fumi con Post-combustore 4 |
| 9d | Realizzazione nuova linea biogas e aria compressa per Post-combustore 4 |
| 9e | Collaudo Gruppo Elettrogeno GE5 e Post-combustore 4 |

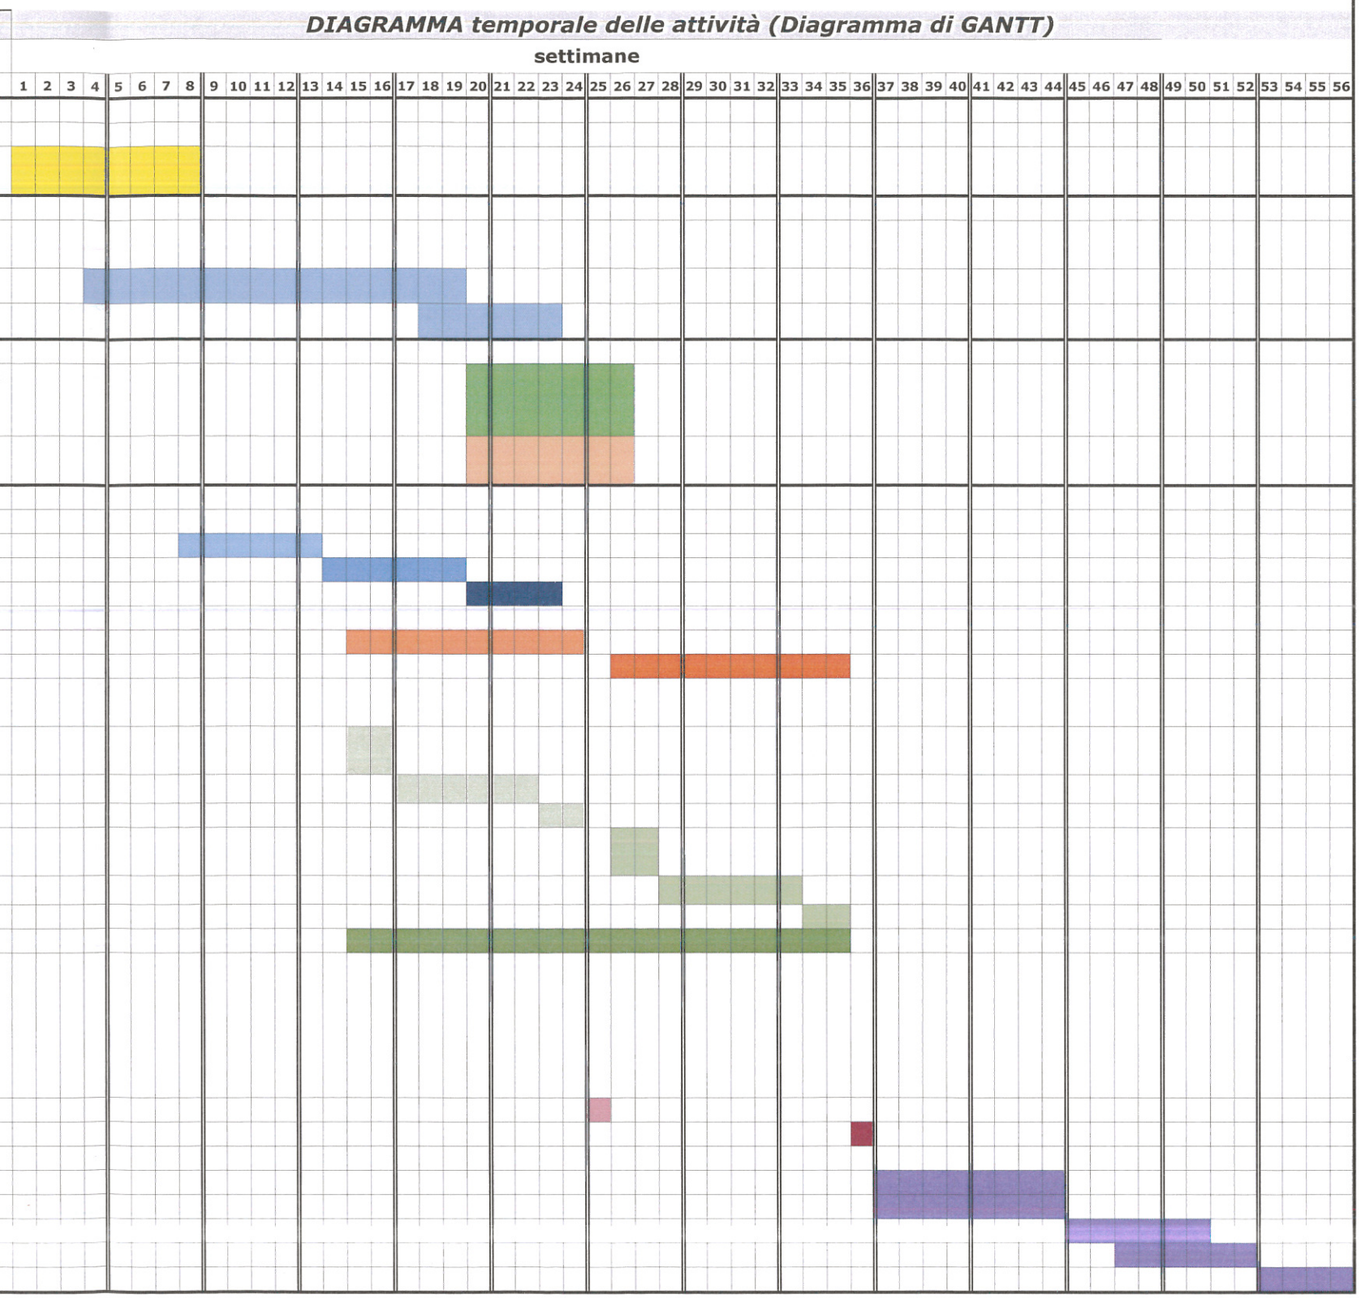


Mpd srl
Il Presidente C.d.A.
Grimaldi Andrea
